

PROJETO


Automação de Processos

UNIDADE

DETIC

GESTOR DO PROJETO

Neirivan Carneiro Menezes Júnior

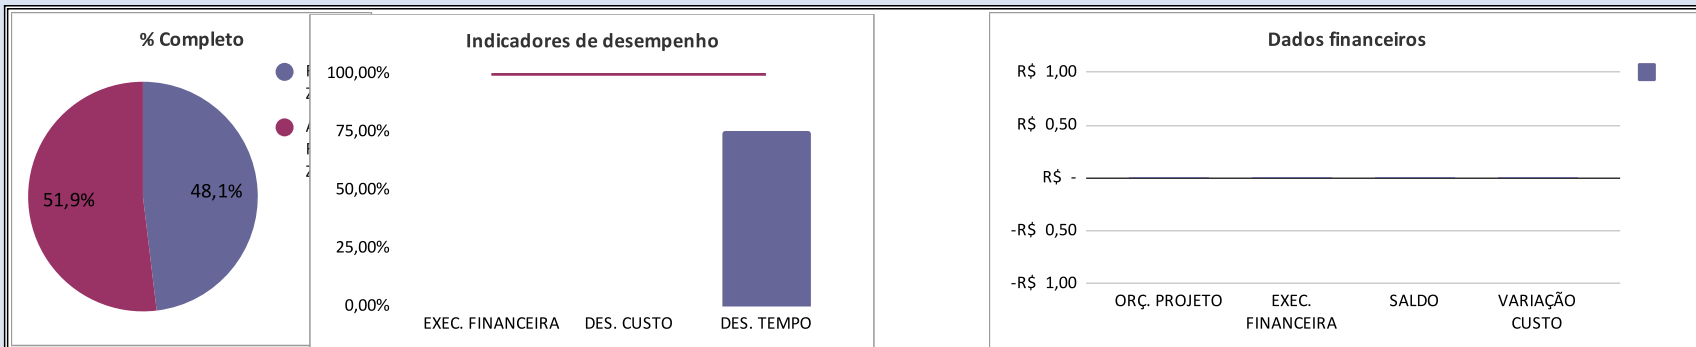

Principais Realizações

As últimas funcionalidades do sistema de corretores estão prontas para homologação;

O módulo de cadastro do SISGP foi iniciado mesmo sem o envio da carga pelo ME;

Foram iniciadas as tratativas para termos acesso às APIs recém disponibilizadas pelo ConectaGov

Pontos de Atenção

O módulo do programa de gestão foi homologado pela SEGES/ME; Aguarda entrada em produção;

Sistema de autorizações está paralizado;

O módulo de cadastro do SISGP foi retomado, agora com apenas um recurso do BBTS; A possibilidade de desligamento dessa pessoa é um risco grande ao andamento do projeto

Próximos Passos

Conclusão das homologações da integração PVGBL/REP

Conclusão das últimas funcionalidades do sistema de corretores

Apresentação da segunda sprint do módulo de cadastro do SISGP

Início da construção das APIs de integração

PLANEJAMENTO					
	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1					
2	Conclusão do sistema de corretores	Neirivan	Moderado	31/3/20	R\$ -
3	Homologação da integração entre os sistemas PVGBL e REP	Neirivan	Alto	31/3/20	R\$ -
4	Homologação do Módulo Programa de Gestão - SisGP	Neirivan	Moderado	31/09/2020	R\$ -
5	Desenvolvimento do sistema de autorização de diretores	Neirivan	Alto	31/3/21	
6	Identificação das integrações necessárias para a autorização de pessoas	Neirivan	Baixo	31/11/2020	
7	Construção de APIs de integração com bases de dados de terceiros	Neirivan	Moderado	31/3/21	
8	Conclusão do Módulo Cadastro - SisGP	Neirivan	Alto	31/3/21	
9	Conclusão do Módulo Capacitação - SisGP	Neirivan	Moderado	30/6/21	
10	Conclusão do Módulo Avaliação de Desempenho - SisGP	Neirivan	Moderado	31/12/21	
11	Contratos.gov integração SEI (Orçamento 4.0)	Leonardo Brasil	Baixo	31/12/20	

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
95%		R\$ -
95%		R\$ -
100%		R\$ -
60%		
100%		
10%		
10%		
	Não iniciado	
	Não iniciado	
	Não iniciado	

