

PROJETO


Revisão do Marco Regulatório de Grandes Riscos

UNIDADE

DIR1/CGRES

GESTOR DO PROJETO

Diogo Ornellas Geraldo

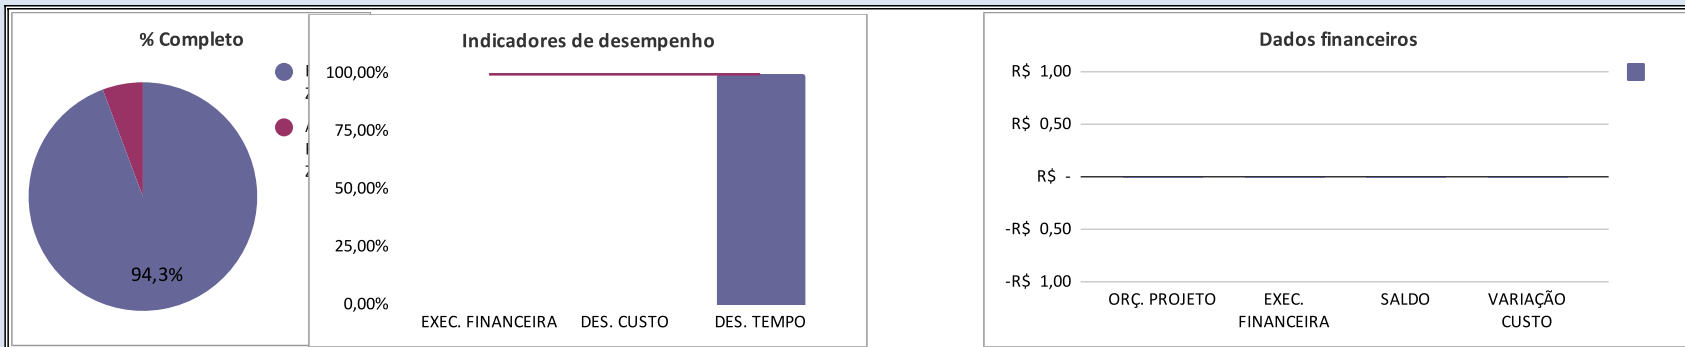

Principais Realizações

Discussões junto aos membros que dão suporte ao CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados). Expectativa de aprovação da norma na próxima reunião colegiada do CNSP.

Pontos de Atenção

Necessidade de esclarecimentos de eventuais dúvidas e apontamentos do CNSP e órgãos de assessoramento do colegiado (em especial a PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

Próximos Passos


Aguardando apreciação e aprovação do normativo pelo CNSP, com previsão de edição do normativo na próxima reunião colegiada (final de Março).


PLANEJAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	Discussões com o mercado	DIR1/CGRES	Alto	25/7/20	
2	Discussões com as áreas técnicas	DIR1/CGRES	Alto	25/7/20	
3	Elaboração de Minuta de normativo	DIR1/CGRES	Muito alto	7/8/20	
4	Submissão e aprovação pelo Conselho Diretor	DIR1/CGRES	Alto	13/8/20	
5	Realização de Consulta Pública	DIR1/CGRES	Alto	30/9/20	
6	Análise da Consulta Pública	DIR1/CGRES	Muito alto	30/10/20	
7	Submissão e aprovação pelo Conselho Diretor	DIR1/CGRES	Alto	19/11/20	
8	Submissão e aprovação pelo CNSP	DIR1/CGRES	Muito alto	9/12/20	
9					
10					
11					

MONITORAMENTO

	STATUS	TEMPO	CUSTO
1	100%		
2	100%		
3	100%		
4	100%		
5	100%		
6	100%		
7	100%		
8	60%		
9			
10			
11			





	FINANCEIRO		N.FINAN		ORÇ. PROJETO	EXEC. FINANCEIRA
	R\$					
OP	R\$ -		70			
VP	R\$ -		66,00		R\$ -	R\$ -
VA	R\$ -		66,00			
CA	R\$ -		NA		EXEC. FINANCEIRA	DES. CUSTO
VC	R\$ -		NA		#DIV/0!	0,00%
% COMPLETO	0%		94%		100,00%	100,00%
IDC	0%		NA		REALIZADO	A REALIZAR
IDT	0%		100,0%		94,29%	5,71%

esforço	peso
Muito alto	10
Alto	8
Moderado	5
Baixo	3
Muito Baixo	1

PRAZO	peso
Não iniciad	0
Execução O	100%

	FINANCEIRO		NÃO FINANCEIRO	
	VA	CA	VP ESFORÇO	VA ESFORÇO
	0,0		8,0	8,00
	0,0		8,0	8,00
	0,0		10,0	10,00
	0,0		8,0	8,00
	0,0		8,0	8,00
	0,0		10,0	10,00
	0,0		8,0	8,00
	0,0		6,0	6,00
	0,0		0,0	0,00
	0,0		0,0	0,00
	0,0		0,0	0,00

SALDO		VARIÇÃO CUSTO	
R\$	-	R\$	-
DES. TEMPO		EXEC. PLANEJADA	
100,00%		94,29%	
100,00%		100,00%	

RO	*VA+ANDAMENTO	Muito alto	Alto	Moderado	Baixo	Muito Baixo	ESFORÇO	%
			8				8	11%
			8				8	11%
		10					10	14%
			8				8	11%
			8				8	11%
		10					10	14%
			8				8	11%
		10					10	14%
							0	0%
							0	0%
							0	0%

Não iniciado	Execução OK	Atrasado	Concluído	ESFORÇO	%
			100%	1	8,00
			100%	1	8,00
			100%	1	10,00
			100%	1	8,00
			100%	1	8,00
			100%	1	10,00
			100%	1	8,00
	100%			1	6,00
				0	0,00
				0	0,00
				0	0,00

